
项目周报

PDF 报表引擎 4.2 迭代

周报编号
ZB-2026-W42-007
2026年10月12日 – 2026年10月18日

汇报人	刘洋	汇报周期	2026年10月12日 – 2026年10月18日

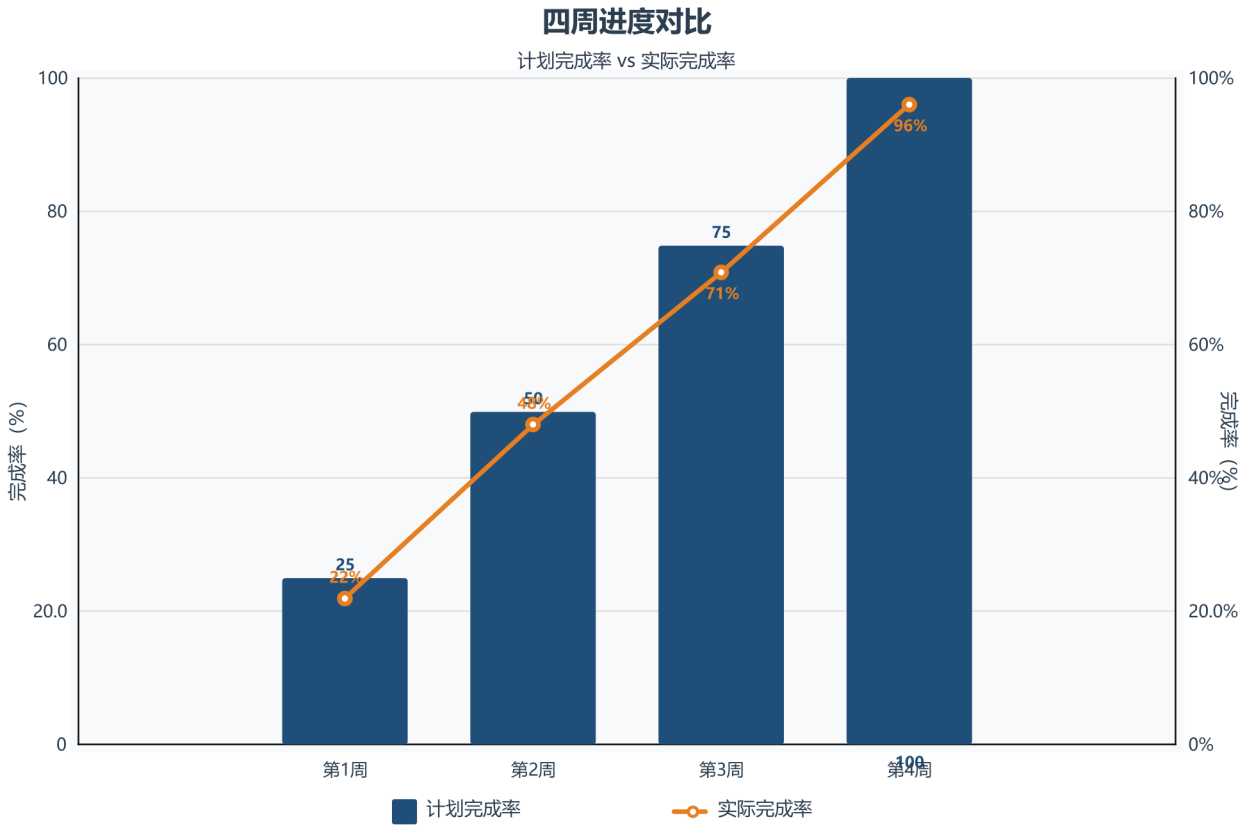

数据来源：项目管理系统

一、本周工作内容

序号	工作事项	负责人	进度	状态
1	报表引擎 4.2 版本联调，完成 12 个模板迁移	刘洋	100%	已完成
2	修复长表格跨页时表头丢失问题（缺陷 #2311）	王敏	100%	已完成
3	SVG 图表内存泄漏排查，已定位到字体缓存未释放	赵磊	85%	进行中
4	新增骑缝章、公章图片嵌入能力，完成接口设计	陈静	70%	进行中
5	国产化环境（麒麟 + 达梦）适配测试	孙浩	45%	进行中
6	压测环境准备，等待运维开通独立集群	周凯	20%	风险

二、下周工作计划

序号	工作事项	负责人	进度	状态

1	完成字体缓存池改造并回归全部 58 份模板	赵磊	0%	进行中
2	骑缝章能力提交测试，覆盖 3 种纸张规格	陈静	0%	进行中
3	国产化适配完成第一轮，输出兼容性问题清单	孙浩	0%	进行中
4	完成 200 并发压测并输出性能报告	周凯	0%	进行中
5	组织业务方评审 5.0 需求草案	刘洋	0%	进行中

三、风险与问题

1. 压测独立集群资源未到位，已影响本周压测计划，风险等级：高，需运维部 10 月 21 日前完成资源分配。
2. 国产化环境字体渲染存在 2 处细微差异（标点挤压），已与厂商沟通，暂无明确解决方案。
3. 业务方新增 3 项需求，若纳入本迭代将导致延期 3 天，需产品经理确认优先级。

四、备注

本周整体完成率 96%，与计划偏差 4%，主要原因为压测环境延迟。下阶段重点工作为字体缓存改造与国产化适配。

本报告由项目管理系统自动汇总，汇报人：刘洋
